




Consorzio di Bonifica Vulture - Alto Bradano

Gaudiano di Lavello

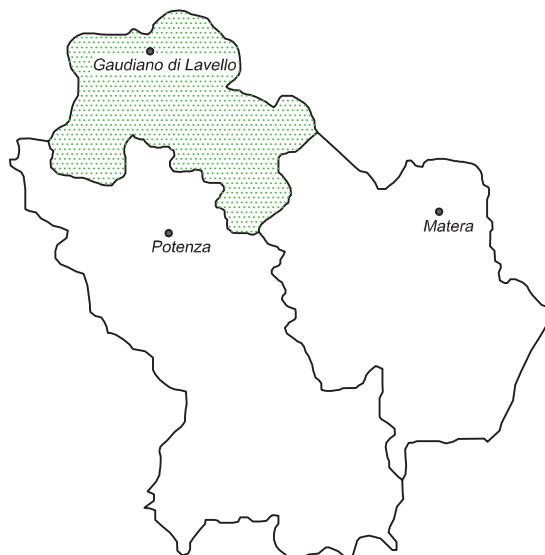

PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2020
Sottomisura 4.3.1 - Investimenti in infrastrutture irrigue

PROGETTO PER IL MIGLIORAMENTO E RECUPERO DELL'EFFICIENZA
DELLE RETI IRRIGUE E BACINI DI ACCUMULO ESISTENTI NEI
COMUNI DI LAVELLO - MELFI - MONTEMILONE E DEL VULTURE

TAV.	PROGETTO ESECUTIVO	DATA
C.8.1		Maggio 2017
SCALA		AGG. Luglio 2017 Luglio 2019
	Cronoprogramma dei lavori I° Lotto lavori	AGG. Genn. 2020

IL PROGETTISTA

geom. Carlo M. Carretta

Firmato digitalmente da

CARLO MAURO CARRETTA

CN = CARRETTA CARLO
MAURO
O = non presente
C = IT

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Marianna Marchitelli

Firmato digitalmente da

Marianna Marchitelli

CN = Marchitelli Marianna

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Giuseppe P. Musacchio

attività lavorative	inizio	durata	fine
ALLESTIMENTO CANTIERE	01/07/2020	28	29/07/2020
SISTEMAZIONE ESTERNA VASCHE	21/10/2020	49	09/12/2020
SISTEMAZIONE ESTERNA VASCHE	24/03/2021	63	26/05/2021
RECINZIONE VASCHE	18/11/2020	84	10/02/2021
RIVESTIMENTO VASCHE CON GUAINA	15/07/2020	98	21/10/2020
RIVESTIMENTO VASCHE CON CLS ARMATO	29/07/2020	84	21/10/2020
PARAPETT IN FERRO PER VASCHE	13/01/2021	84	07/04/2021
SMOBILIZZO CANTIERE	26/05/2021	36	01/07/2021
TOTALE APPALTO	01/07/2020	365	01/07/2021

